


2024年7月度統括安全衛生管理工程表

2024年7月1日 作成

工事名称		秋田県南地区広域汚泥資源化事業						今月の安全目標	事業所特記事項	現場代理人	監理技術者	主任技術者	主任技術者																										
工 期	契約工期	令和5年1月13日 ~ 令和7年3月31日		6月累計予定出来高	25.0%	7月予定出来高	9.5%	・重機接触災害の防止 ・墜落、転落災害の防止 ・飛来、落下災害の防止 ・電動工具類による災害の防止		富樫	富樫	大倉	川崎																										
	実際工期	令和6年3月25日 ~ 令和7年3月31日		6月累計実際出来高	32.5%	7月累計予定出来高	42.0%																																
請負区分		JV																																					
工 種 (主要工種)	月	6月							7月														備 考																
	日	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
仮設工事	地足場組立																																						
汚泥資源化棟 地業工事																																※7/3 第4回全体会議							
土工事	根伐り・砕石敷																															※7/18 県議会現場視察							
鉄筋工事	基礎配筋①~⑦																																						
型枠工事	捨コン枠																																						
コンクリート工事	捨コン																																						
鉄骨工事	ハイバースセット																																						
生物脱臭棟	基礎根伐り、砕石、捨コン																																						
事務所棟	基礎根伐り、砕石																																						
正門付近・既設棟	上水・排水・処理水・電話用埋設配管工事																															駐車範囲が狭くなります。							
行事予定	現場休業日																																						
使用機械等予定	BH0.7 10tDT クレーン車																																						
安全当番	野本 協力会社																																						
特定された危険又は有害要因	重機相互の接触																																						
週間目標及び防止対策実施事項	重機災害の防止																																						



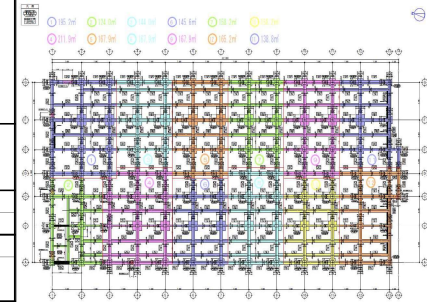

工種	
撮影年月日	7月末
撮影位置	

内容
ドローン全景



工種	
撮影年月日	7月末
撮影位置	

内容
ドローン全景



工種	
撮影年月日	7月末
撮影位置	

内容
ドローン全景
