


2024年12月度統括安全衛生管理工程表

2024年12月3日 作成

工事名称		秋田県南地区広域汚泥資源化事業						今月の安全目標		事業所特記事項		現場代理人	監理技術者	主任技術者	主任技術者																										
工期	契約工期	令和5年1月13日	～	令和7年3月31日	11月累計予定出来高	80.4%	12月予定出来高	6.8%	・重機接触災害の防止 ・墜落、転落災害の防止 ・飛来、落下災害の防止 ・電動工具類による災害の防止		富樫	富樫	大富	川崎																											
	実際工期	令和6年3月25日	～	令和7年3月31日	11月累計実際出来高	84.8%	12月累計予定出来高	91.6%																																	
請負区分		JV																																							
工種 (主要工種)	月	11月						12月						備考																											
	日	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
仮設工事								B工区内外部足場組立						A工区内外部足場解体						※12/4 第9回全体会議																					
汚泥資源化棟								B工区内外部足場組立						A工区内外部足場解体						※12/29～1/5 年末年始休暇(1/6 除雪日)																					
防水工事								ピット内塗布防水						外部シーリング																											
プラント設備		足場組立						1000φ						1000φ						700φ																					
鉄筋工事								B工区壁配筋						B工区壁配筋						A工区メッシュ敷																					
プラント電気		ファン設置												ケーブルラック設置						ケーブルラック設置						外構(接地極工事)															
型枠工事		A工区壁型枠組立						B工区壁型枠組立						B工区壁型枠組立						B工区壁型枠組立						排水溝枠取付															
建築電気		照明器具取付						照明器具取付						照明器具取付						照明器具取付						照明器具取付															
コンクリート工事		④土間コン ⑤土間コン						⑥土間コン																																	
鉄骨工事		屋根上点検歩廊工事						間仕切り壁①						間仕切り壁②						柱2回目						間仕切り壁③間仕切り壁④間仕切り壁⑤				間仕切り壁⑥ 嵩上コン①											
内外壁工事		A工区外壁張り						A工区内壁張り・ウレタン吹付						B工区外壁張り																											
金属製建具工事								B工区サッシ取付						A工区HD取付						B工区HD取付																					
左官工事								胴縁下モルタル・壁補修																																	
生物脱臭棟		壁コン 40㎡						嵩上止枠						土間嵩上コン						脱型						配管ピット底盤コン 10㎡				外部足場解体				パネルゲート、防鳥ネット取付							
プラント設備								嵩上部分配筋						126㎡																堰板支柱取付、堰板取付				機器搬入 配管サポート設置				機器取付 ダクトサポート設置			
事務所棟		掘削・排水ユニット						検査 配管接続						CON						養生期間						タイル工事				仕上げ											
行事予定		現場休業日						現場休業日						現場休業日						現場休業日						現場休業日				現場休業日				現場休業日							
使用機械等予定		高所作業車 クレーン車・ポンプ車						高所作業車 クレーン車、ポンプ車						高所作業車 クレーン車、ポンプ車						高所作業車 クレーン車、ポンプ車						高所作業車 クレーン車、ポンプ車															
安全当番		川崎 ムトウ						富樫 加藤板金						野本 熊谷工業						渡邊 マルケン工業						川崎 ムトウ															
特定された危険又は有害要因		高所からの転落・墜落 吊荷が落下する 重機が倒れる						高所からの転落・墜落 吊荷が落下する 重機が倒れる						高所からの転落・墜落 吊荷が落下する 重機が倒れる						高所からの転落・墜落 吊荷が落下する 重機が倒れる						高所からの転落・墜落 吊荷が落下する 重機が倒れる															
週間目標及び防止対策実施事項		重機災害の防止 作業前のKYKの実施 有資格者に依る作業の徹底 周囲安全確認の徹底						重機災害の防止 作業前のKYKの実施 有資格者に依る作業の徹底 周囲安全確認の徹底						重機災害の防止 作業前のKYKの実施 有資格者に依る作業の徹底 周囲安全確認の徹底						重機災害の防止 作業前のKYKの実施 有資格者に依る作業の徹底 周囲安全確認の徹底						重機災害の防止 作業前のKYKの実施 有資格者に依る作業の徹底 周囲安全確認の徹底															




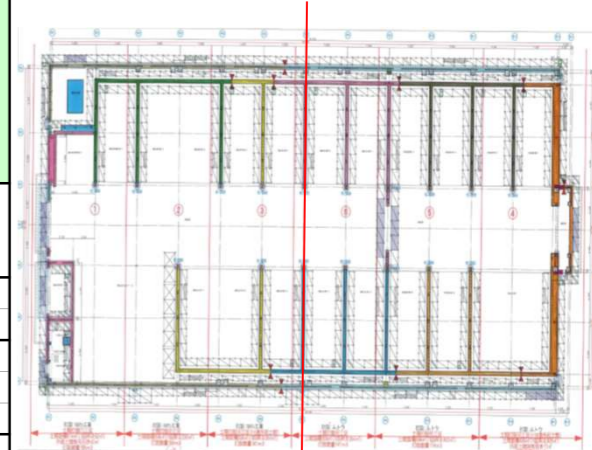

工種	
撮影年月日	12月末
撮影位置	
内容 ドローン全景	



工種	
撮影年月日	12月末
撮影位置	
内容 ドローン全景	

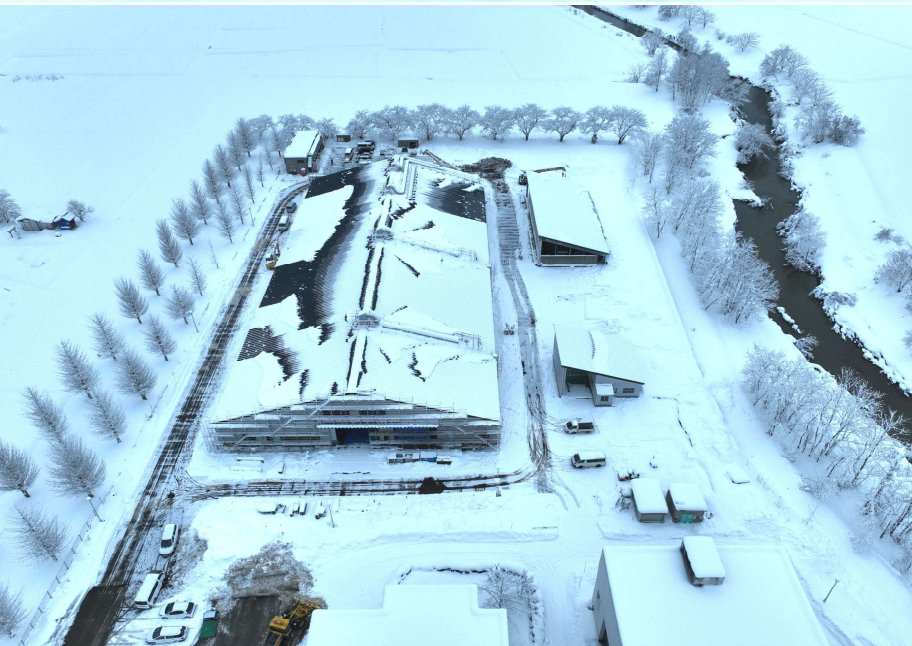

工種	
撮影年月日	12月末
撮影位置	
内容 ドローン全景	



12.27現在 現況写真
汚泥資源化棟 南東側より

.....

.....

.....

.....

.....

.....



12.27現在 現況写真
生物脱臭棟 南東側より

.....

.....

.....

.....

.....

.....



12.27現在 現況写真
事務所棟 北西側より

.....

.....

.....

.....

.....

.....



12.27現在 現況写真

汚泥資源化棟 内部



12.27現在 現況写真

生物脱臭棟 内部



12.27現在 現況写真

事務所棟 内部
