


2024年11月度統括安全衛生管理工程表

2024年10月25日 作成

工事名称		秋田県南地区広域汚泥資源化事業						今月の安全目標		事業所特記事項		現場代理人	監理技術者	主任技術者	主任技術者																								
工期	契約工期	令和5年1月13日	～	令和7年3月31日	10月累計予定出来高	75.6%	11月予定出来高	10.3%	・重機接触災害の防止 ・墜落、転落災害の防止 ・飛来、落下災害の防止 ・電動工具類による災害の防止		富樫	富樫	大塚	川崎																									
	実際工期	令和6年3月25日	～	令和7年3月31日	10月累計実際出来高	74.5%	11月累計予定出来高	84.8%																															
請負区分		JV										備考																											
工種 (主要工種)	月	10月							11月																														
	日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
仮設工事																																							
汚泥資源化棟																																							
土工事																																							
鉄筋工事																																							
型枠工事																																							
コンクリート工事																																							
鉄骨工事																																							
屋根・外壁工事																																							
金属製建具工事																																							
生物脱臭棟																																							
事務所棟																																							
行事予定																																							
使用機械等予定																																							
安全当番	元請																																						
協力会社																																							
特定された危険又は有害要因																																							
週間目標及び防止対策実施事項																																							
特定された危険又は有害要因の除去低減策																																							

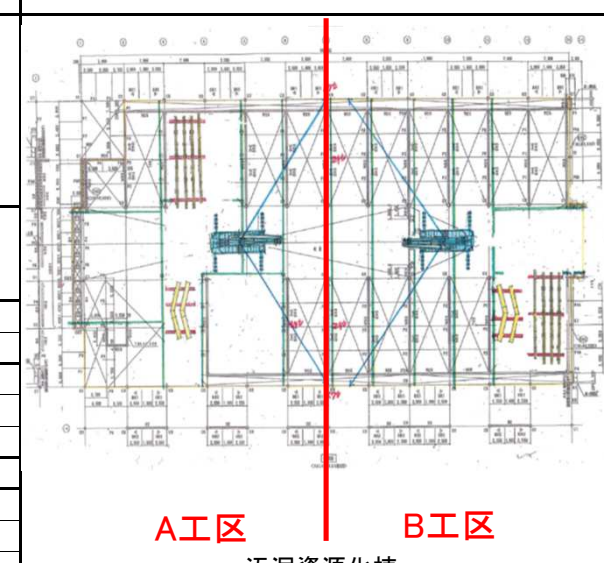

汚泥資源化棟 丸茂・共和・半田 特定JV



工種	
撮影年月日	11月末
撮影位置	
内容	ドローン全景



工種	
撮影年月日	11月末
撮影位置	
内容	ドローン全景



工種	
撮影年月日	11月末
撮影位置	
内容	ドローン全景
