2025年1月度統括安全衛生管理工程表

2025年1月7日　作成

工事名称	秋田県県南地区広域汚泥資源化事業					今月の安全目標	・重機接触災害の防止 ・墜落、転落災害の防止 ・飛来、落下災害の防止 ・電動工具類による災害の防止	事業所特記事項		現場代理人	監理技術者	主任技術者	主任技術者
工期 契約工期	令和5年1月13日 ～ 令和7年3月31日	12月累計予定出来高	85.2%	1月予定出来高	8.7%					冨樫	冨樫	大畠	川崎
工期 実際工期	令和6年3月25日 ～ 令和7年3月31日	12月累計実際出来高	91.3%	1月累計予定出来高	100.0%								
請負区分	JV												

工種（主要工種）	12月 25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	1月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	備考
					年末年始特別休暇																									建築工事完成検査期間									
仮設工事	内部コン打設足場解体																	B工区内部足場解体									AB工区妻側外部足場解体											※1/31　県契約検査課の検査（建築）
汚泥資源化棟													休																										
防水工事	外部シーリング													外部シーリング							外部シーリング																		※1/23又は24　消防検査予定
													暇																										
鉄筋工事	A工区メッシュ敷																B工区メッシュ敷																						※1/28又は29　主事検査予定
													明け																										
型枠工事	配管ピット枠取付													配管ピット枠取付													脱型												
													除																										
コンクリート工事			嵩上コン①																		嵩上コン②		嵩上コン③																
													雪																										
																																		サイン工事					
													日																										
塗装工事	SD塗装													各所塗装							外部腰壁塗装																		
内外壁工事	B工区外壁張り													B工区内壁張り																									
														9通りウレタン																									
金属製建具工事	B工区HD取付														シートシャッター取付								ハンガードア吊り				網戸設置												
左官工事	壁補修													壁補修							各所補修						各所補修												
生物脱臭棟	防鳥ネット																																						
		ダクト架台																																					
事務所棟	床タイル張り																													クリーニング工事									
外構工事	掘削、路盤置き換え												掘削、路盤置き換え								掘削、路盤置き換え、側溝据付																		
行事予定					現場休業日	現場休業日	現場休業日	現場休業日	現場休業日	現場休業日	現場休業日	現場休業日						現場休業日	現場休業日	現場休業日						現場休業日							現場休業日						

使用機械等予定				高所作業車 クレーン車	高所作業車 クレーン車、ポンプ車	高所作業車	
安全当番	元請			川崎	冨樫	野本	
	協力会社			ムトウ	㈱大槻工業		
特定された危険又は有害要因				高所からの転落・墜落	高所からの転落・墜落	高所からの転落・墜落	
				吊荷が落下する	吊荷が落下する	吊荷が落下する	
				重機が倒れる	重機が倒れる	重機が倒れる	
週間目標及び防止対策実施事項 特定された危険又は有害要因の除去低減策				重機災害の防止	重機災害の防止	重機災害の防止	
				作業前のKYKの実施	作業前のKYKの実施	作業前のKYKの実施	
				有資格者に依る作業の徹底	有資格者に依る作業の徹底	有資格者に依る作業の徹底	
				周囲安全確認の徹底	周囲安全確認の徹底	周囲安全確認の徹底	

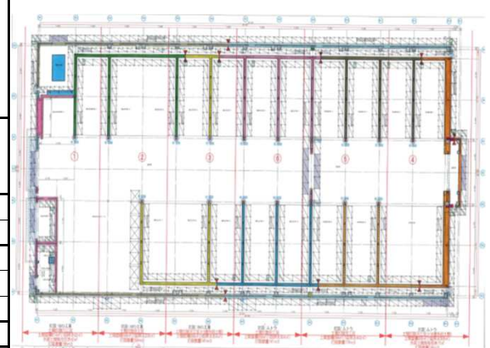

丸茂・共和・半田　特定JV

工事履行報告書 別紙

工 種	
撮 影 年月日	1月末
撮 影 位 置	
内 容 ドローン全景	

工 種	
撮 影 年月日	1月末
撮 影 位 置	
内 容 ドローン全景	

工 種	
撮 影 年月日	1月末
撮 影 位 置	
内 容 ドローン全景	

工事履行報告書 別紙

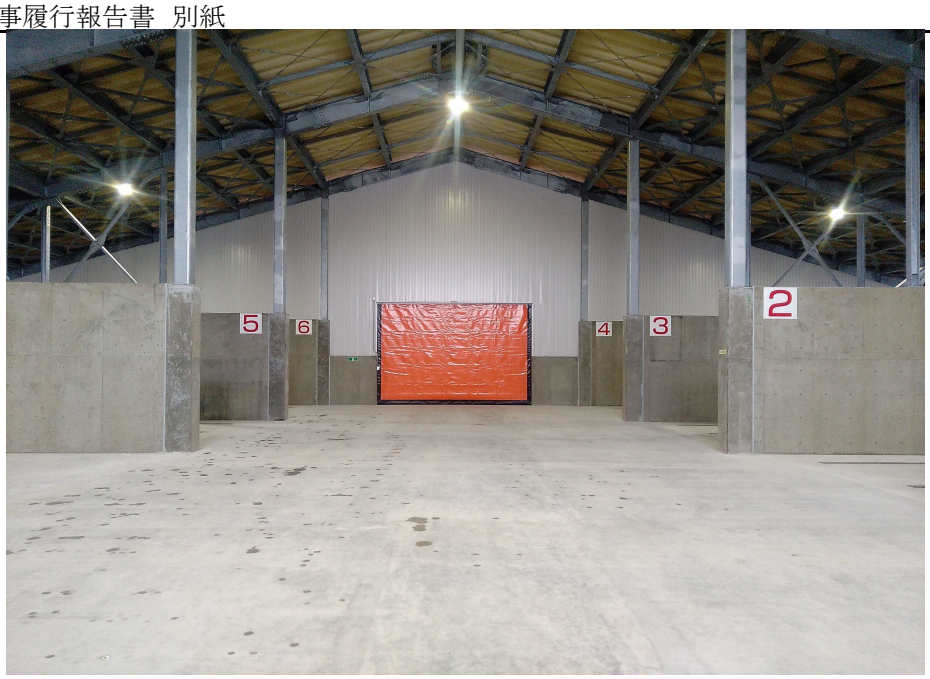

工　種	
撮　影 年月日	
撮　影 位　置	
内　容 汚泥資源化棟 建築工事完成	

工　種	
撮　影 年月日	
撮　影 位　置	
内　容 生物脱臭棟 建築工事完成	

工　種	
撮　影 年月日	
撮　影 位　置	
内　容 事務所棟 建築工事完成	
